



CAMMESA

Previsión Semanas 27/26 y 28/26

Despacho Energético

Gerencia de Coordinación Operativa, 03/07/26

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires

(fuente SMN)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA



0.6°C

Despejado
Actualizado: 09h

Humedad: 85 %
Presión: 1029.4 hPa
Viento: Sudoeste a 4 km/h
Visibilidad: 10 km

REF

Sol
08:01
17:55
Fuente SHN

Pronóstico para los próximos 7 días

Pronóstico oficial del día viernes, 3 de Julio de 2026 - actualizado a las 08:24 horas

Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Mín -1°C Máx 10°C	Mín 3°C Máx 11°C	Mín 7°C Máx 12°C	Mín 6°C Máx 13°C	Mín 3°C Máx 16°C	Mín 6°C Máx 17°C	Mín 7°C Máx 16°C

Viernes, 3 de Julio de 2026

Tiempo

Mañana	Tarde	Noche
 Algo nublado	 Parcialmente nublado	 Algo nublado

Prob. Precipitación	0%	0%	0%
Temperatura (°C)	-1	10	6
Viento (km/h)	7 - 12	7 - 12	7 - 12
Dirección Predominante	S	SE	E
Ráfagas (km/h)	-	-	-

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires

(fuente Weather Channel)

Día	Condiciones	Bajo	Alto	Viento
Hoy	 2% Parcialmente nublado	3°	9°	7 km/h ↖ SSE
sáb 04	 6% Nublado	8°	10°	9 km/h ← E
dom 05	 64% Chubascos	5°	10°	7 km/h ↖ ESE
lun 06	 8% Parcialmente nublado	3°	11°	16 km/h → W
mar 07	 6% Mayormente soleado	8°	15°	14 km/h ↘ NW
mié 08	 4% Parcialmente nublado	9°	17°	15 km/h ↘ NNW
jue 09	 5% Mayormente nublado	9°	15°	9 km/h ↖ ENE
vie 10	 31% Chubascos matinales	8°	13°	12 km/h ↖ ESE
sáb 11	 24% Mayormente nublado	6°	13°	12 km/h ↑ S
dom 12	 10% Parcialmente nublado	7°	13°	11 km/h ↗ WSW
lun 13	 12% Parcialmente nublado	7°	14°	13 km/h ↘ NW
mar 14	 11% Parcialmente nublado	7°	14°	13 km/h ↘ WNW
mié 15	 16% Parcialmente nublado	6°	13°	13 km/h ↗ SSW
jue 16	 21% Parcialmente nublado	7°	13°	13 km/h ↖ SE
vie 17	 39% Chubascos matinales	7°	13°	13 km/h ↖ SE



Escenario previsto

Importación:

Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil: Con oferta comercial.

Exportación:

Uruguay y Brasil: No se realiza oferta de exportación comercial.

Gas y Combustible alternativo: El gas promedio de esta semana cierra en 36.5 Mm3, previendo disponibilidad de 38.5 Mm3 para la semana próxima que no serán suficientes para cubrir el requerimiento de la demanda por lo que se recurrirá a 23.000 tn de carbón, 7.000 tn de FO y 27.000 m3 de GO.

Salto Grande: 14 unidades disponibles. Opera con riego de vertimiento, con posible vertimiento durante la semana próxima, con promedio semanal de aportes 10.500 m3/s.

Yacyretá: Opera con máxima generación y vertimiento comienzo de la semana proxima, luego despacho máximo con riesgo de vertimiento, con entrante promedio en el orden de 13.400 m3/s. ANDE prevé tomar 800 MW en horario de pico.

Comahue: Caudales entrantes actuales de 94 m3/s en el Limay, 123 m3/s en el Collón Curá y 69 m3/s en el Neuquén.

Chañar: Erogado 46 m3/s definido por AIC.

Arroyito: Erogado bajando al mínimo de 250 m3/s definido por AIC.



Situación parque generador

CENTRALES TÉRMICAS				
CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
ATUCHA I		Indisponible	31-mar-27	Extension de vida útil
ROJO	TG02	Indisponible		
P. NUEVO	TV09	Indisponible	Fines de julio	Mantenimiento Estacional
LUJAN DE CUYO	TG26	Indisponible	Sin previsión	Falla en generador
S. FRANCISCO	TG01	Indisponible		Retraso en Mantenimiento Estacional
S. OESTE	TG01 y TG04	Indisponible		Rotura de rotor de turbina
V. MARÍA	TG02 y TG03	Indisponible		Altas vibraciones
INDEPENDENCIA	TG01	Indisponible	6-jul al 10-jul	Mantenimiento Estacional

CENTRALES HIDRÁULICAS				
CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
YACYRETÁ	U01	Indisponible	27-nov	Mantenimiento Estacional
	U04	Indisponible	22-jun al 14-jul	Mantenimiento Estacional
	U10	Indisponible	26-feb-27	Mantenimiento Estacional
RÍO GRANDE	U01 y 04	Indisponible	Sin previsión	Por falla estatórica
	U03	Indisponible	Sin previsión	
L. VIÑAS	U01 y U02	Indisponible		Pérdida de agua en cañería principal
NIHUILES	NIH2 y NIH3	Indisponible	Sin previsión	Temporal 11-01
LOS REYUNOS	U01	Indisponible	8-jul	Mantenimiento Estacional hasta el 19-jun
EL TIGRE	U01 y U02	Indisponible	3-ago	Mantenimiento Estacional




Perspectivas para la próxima semana


Balance Semanal			Semana 27		Semana 28	
			29/6/2026 - 5/7/2026		6/7/2026 - 12/7/2026	
			Gwh	MWmed	Gwh	MWmed
Consumo Combust.	Demanda		3571	21255	3223	19187
	Exportación		0	0	0	0
	Térmico		1820	10831	1569	9338
	Hidráulico		897	5336	754	4486
	Nuclear		236	1407	236	1404
	Renovable		360	2140	435	2589
	Importación		261	1554	230	1370
	Gas	Mm3/día	36.5		38.5	
	FO	Miles de Ton	13		7	
	GO	Miles de m3	83		27	
	Carbón	Miles de Ton	22		23	
Despacho MW med	ALICURA		179		87	
	PIEDRA		668		534	
	CHOCON		224		129	
	P.BANDERITA		22		19	
	FUTALEUFÚ		311		219	
	SALTO		716		796	
	YACYRETA		2431		2268	
Niveles (msnm)			Hoy	Domingo	Domingo	
	ALICURA		698.34	697.37	697.50	
	PIEDRA		575.72	574.81	573.81	
	CHOCON		373.28	373.47	373.71	
	P.BANDERITA		411.73	411.74	411.76	
	FUTALEUFÚ		475.25	474.14	473.56	
	SALTO		32.12	33.02	35.28	




Evolución Cota Alicura 💧

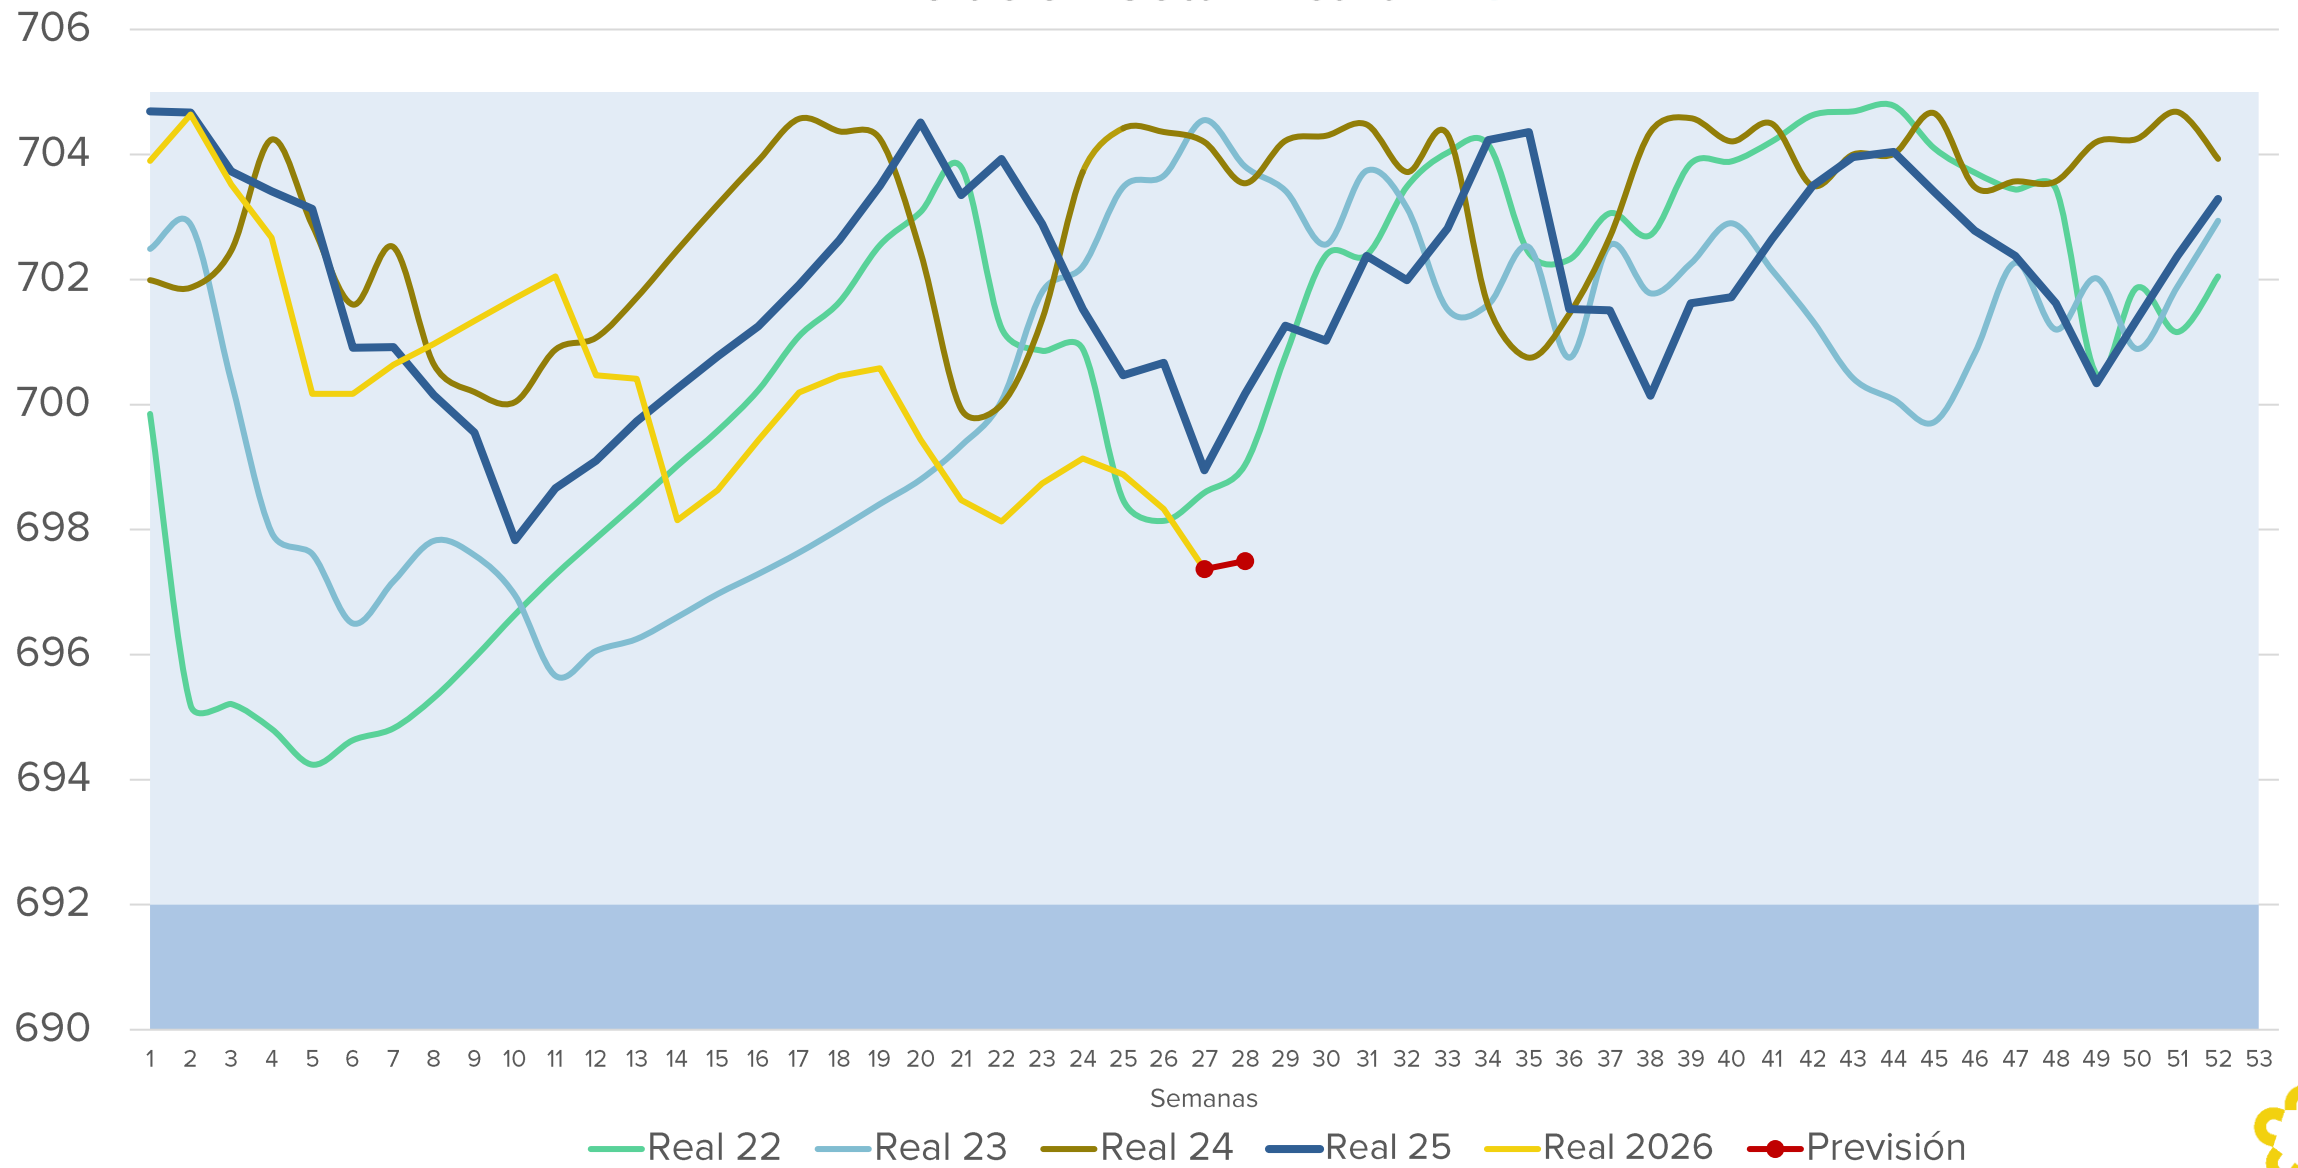


Evolución Cota Piedra del Águila 💧

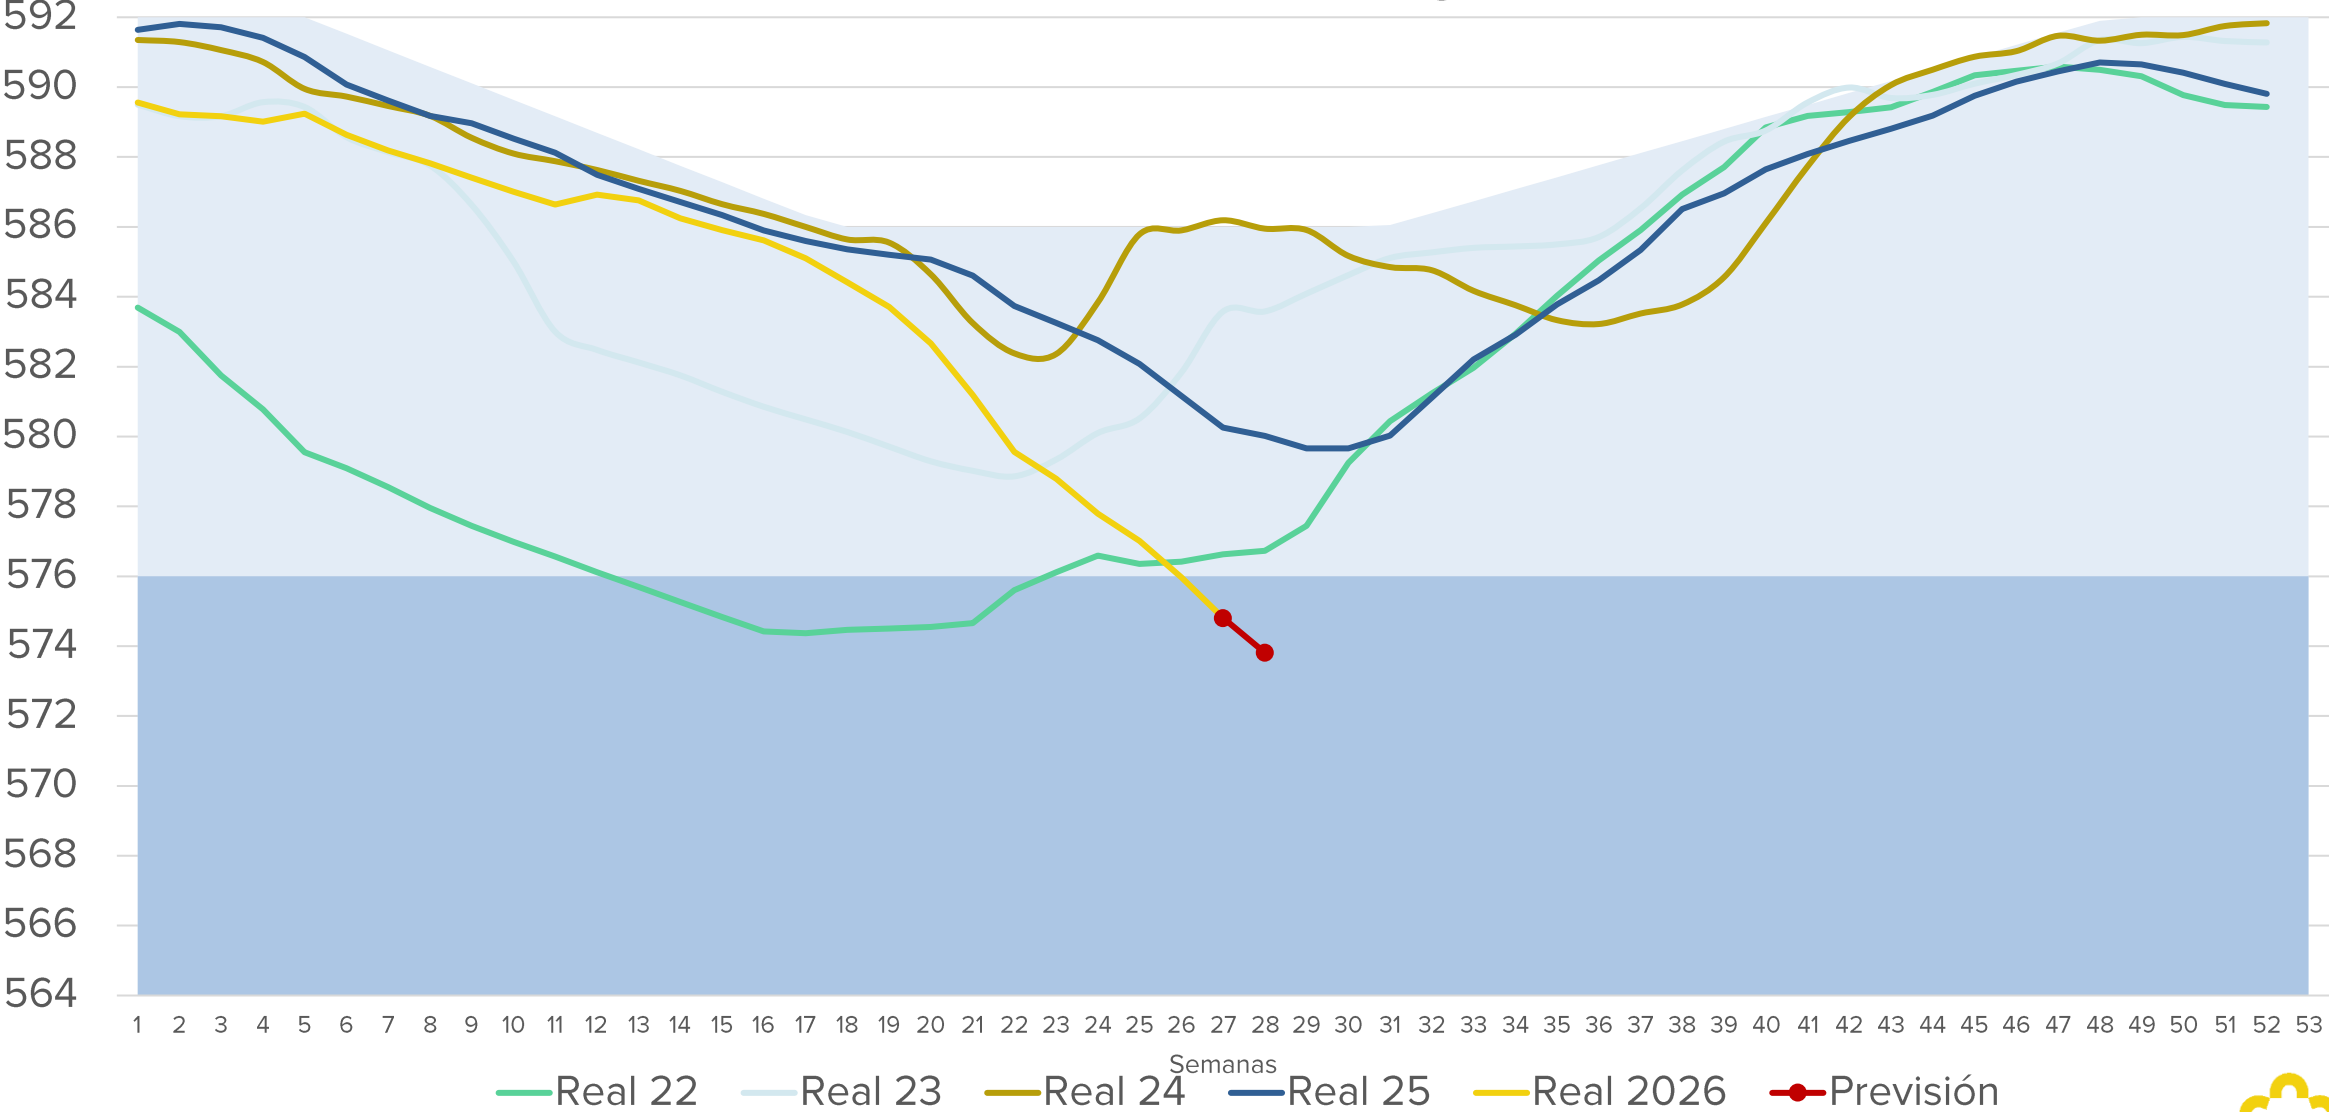


Evolución Cota Chocón 💧

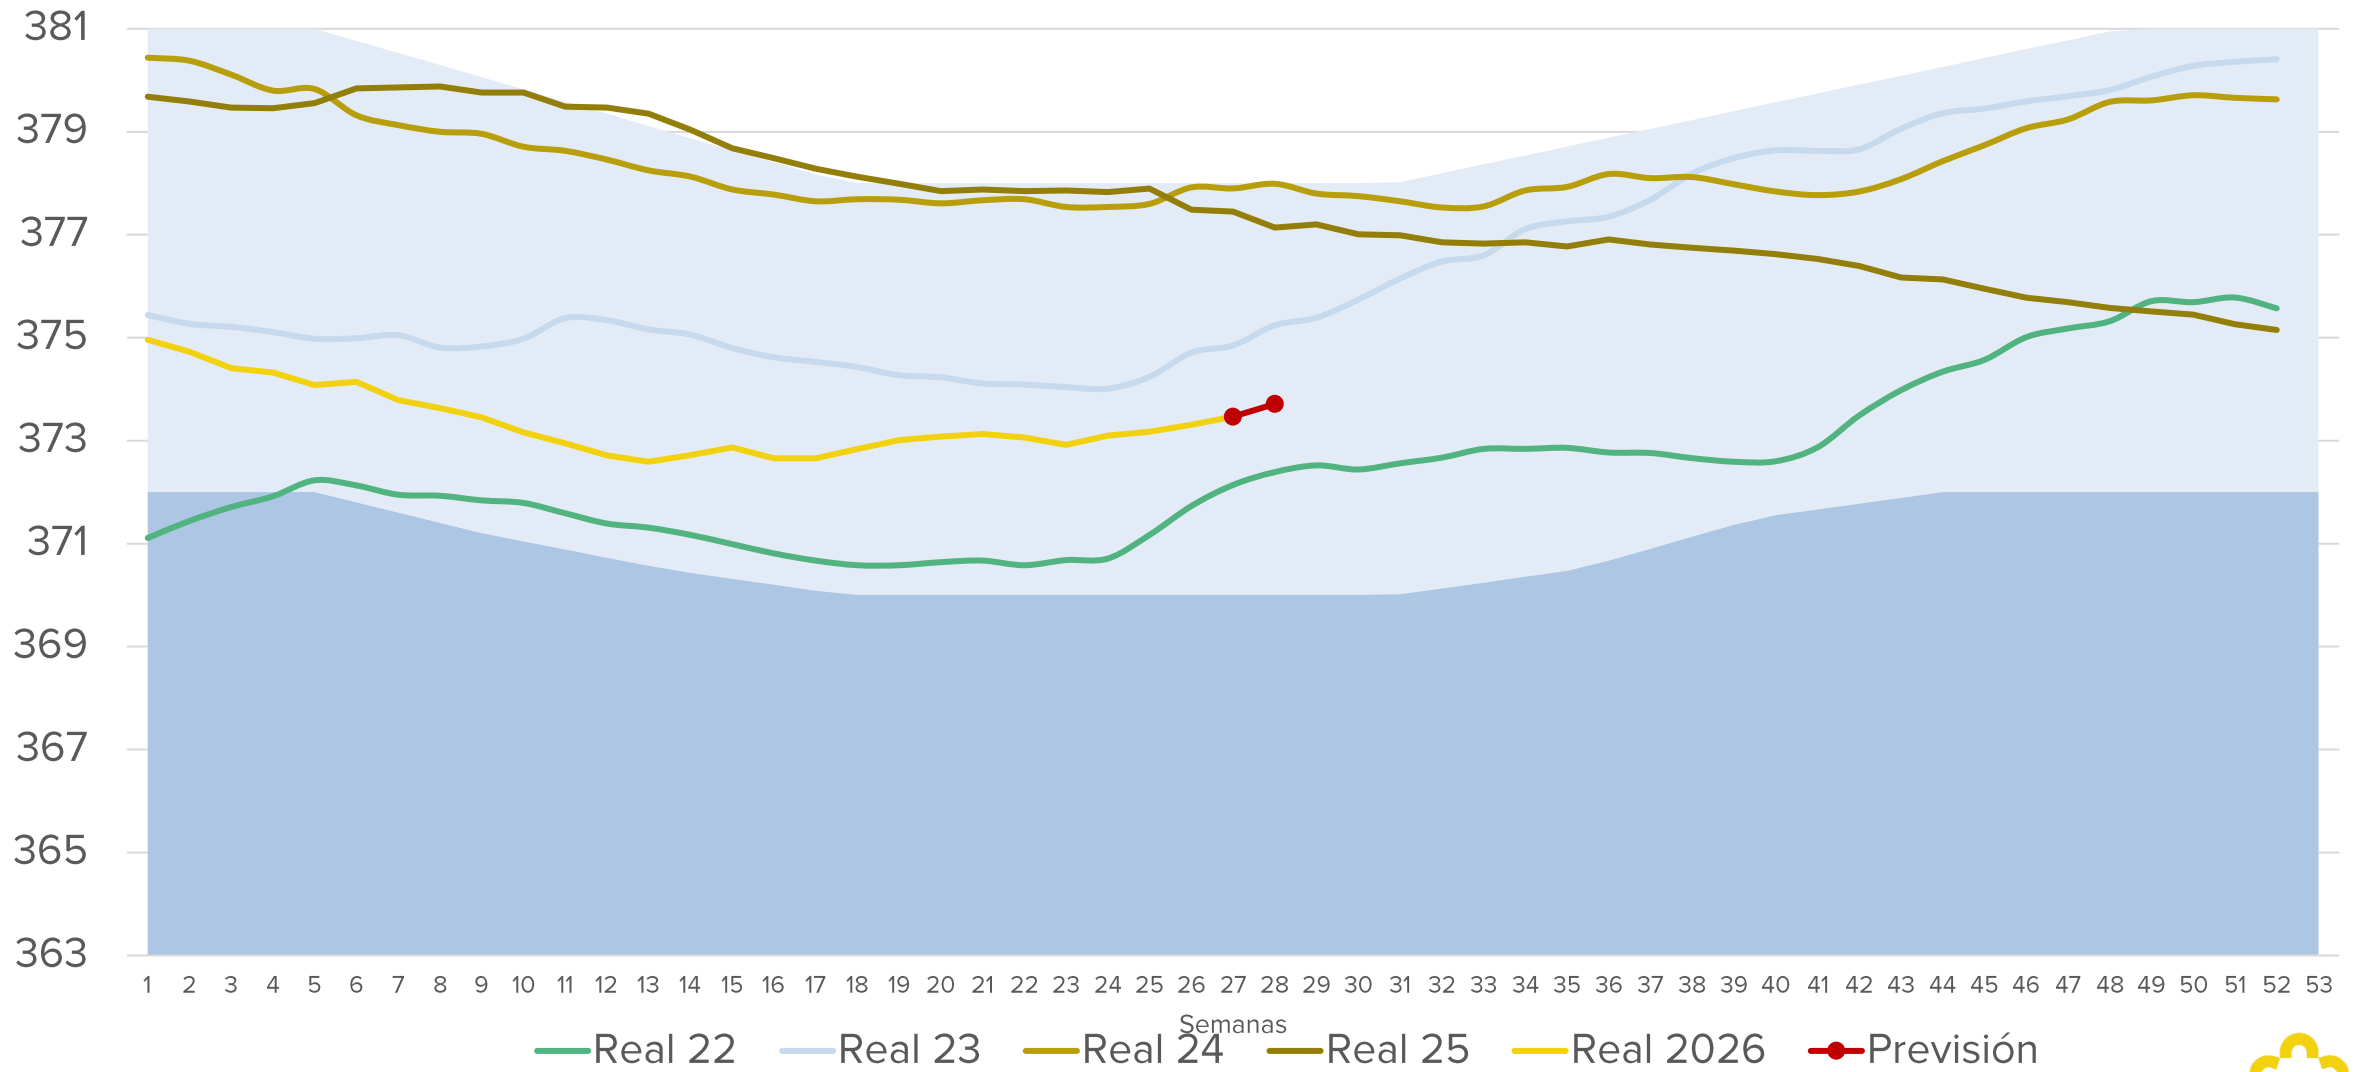

Evolución Cota Planicie Banderita 💧

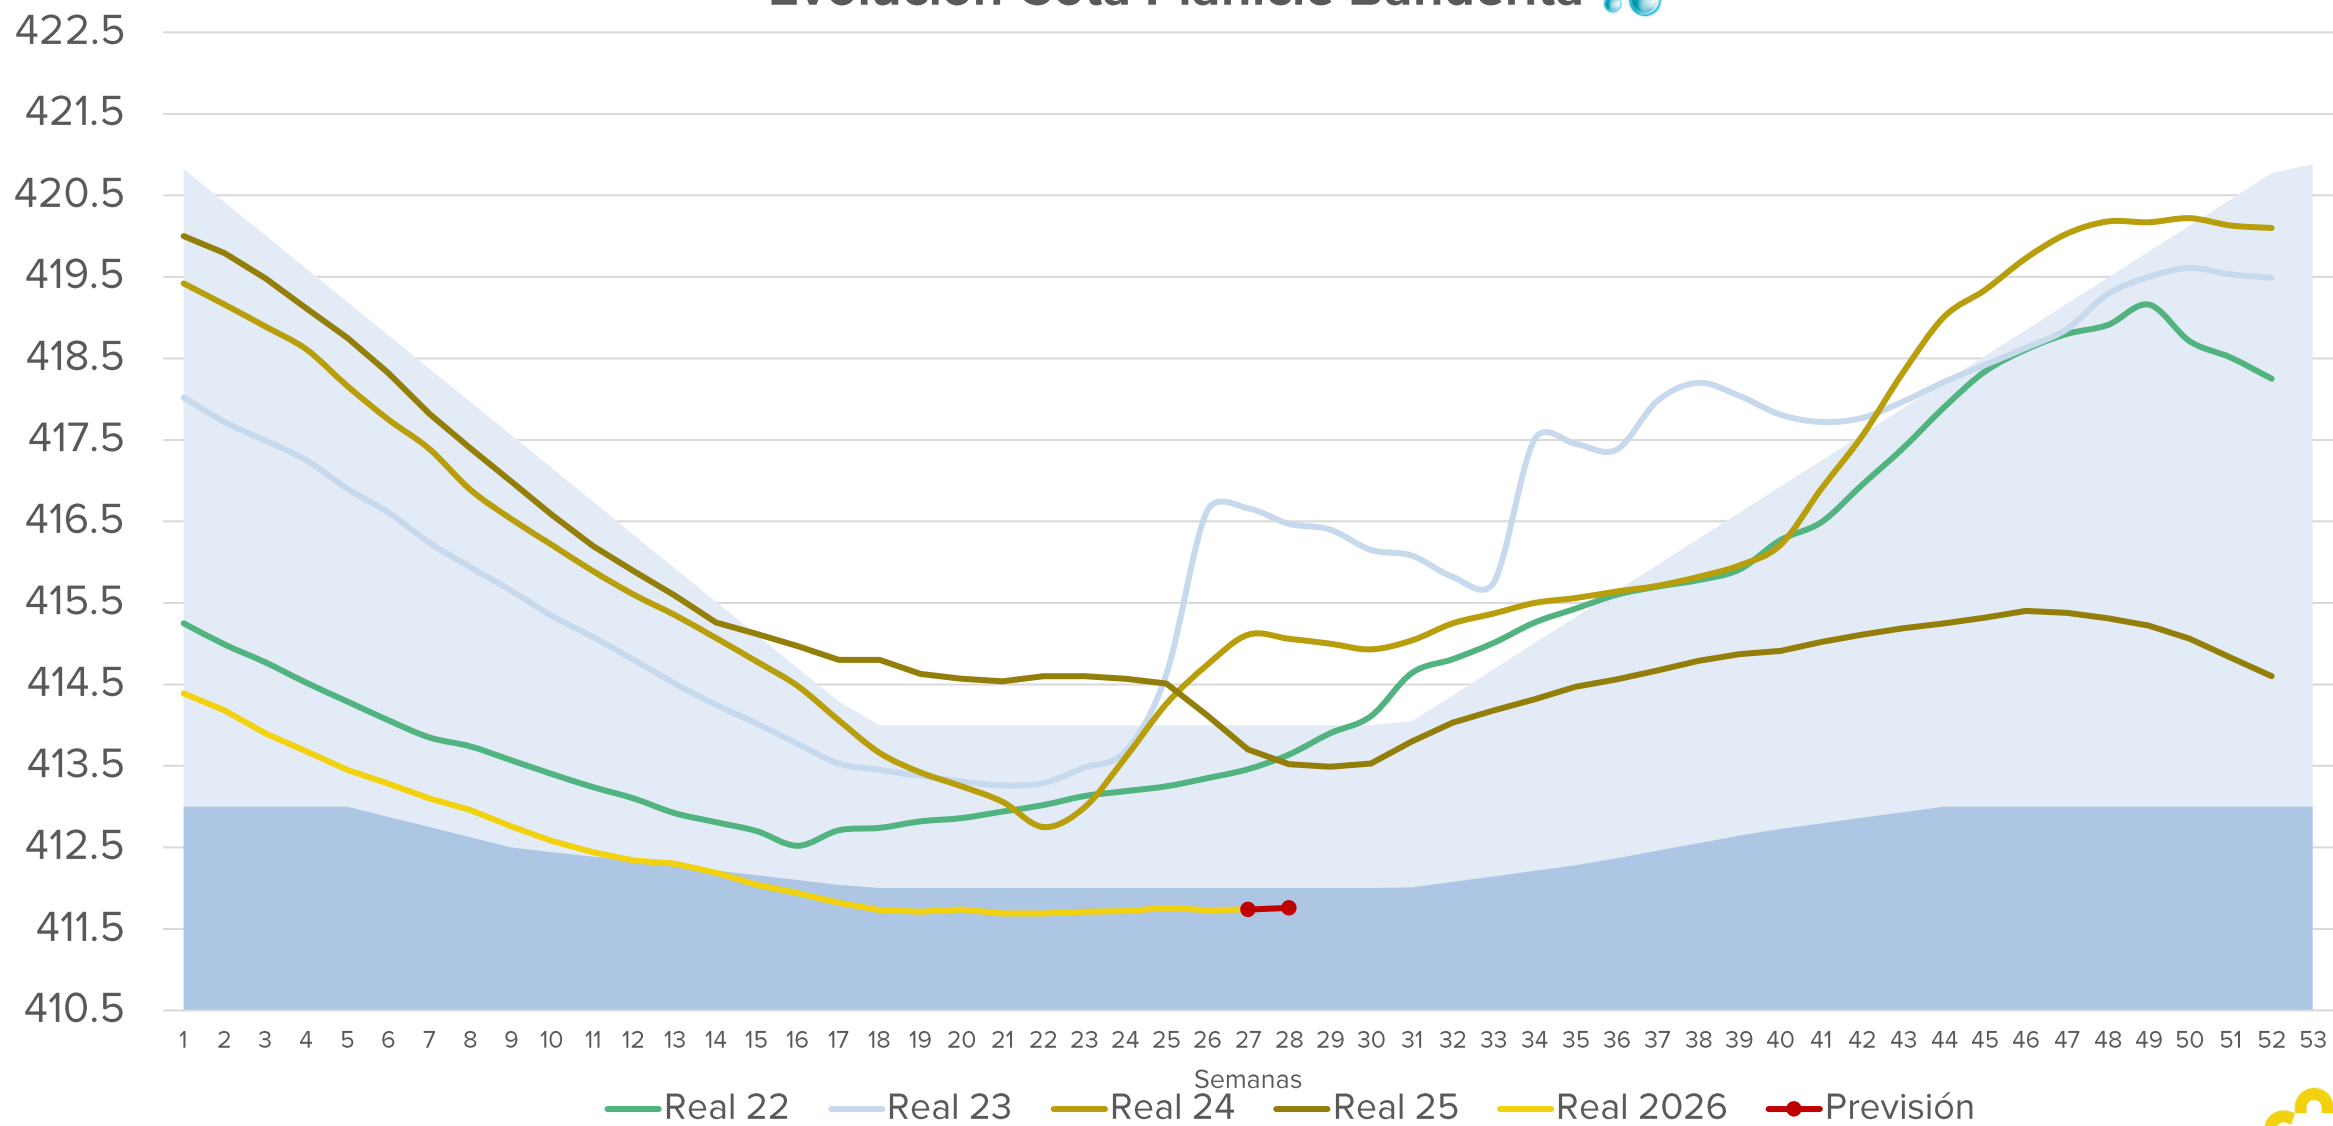

Evolución Cota Futaleufú

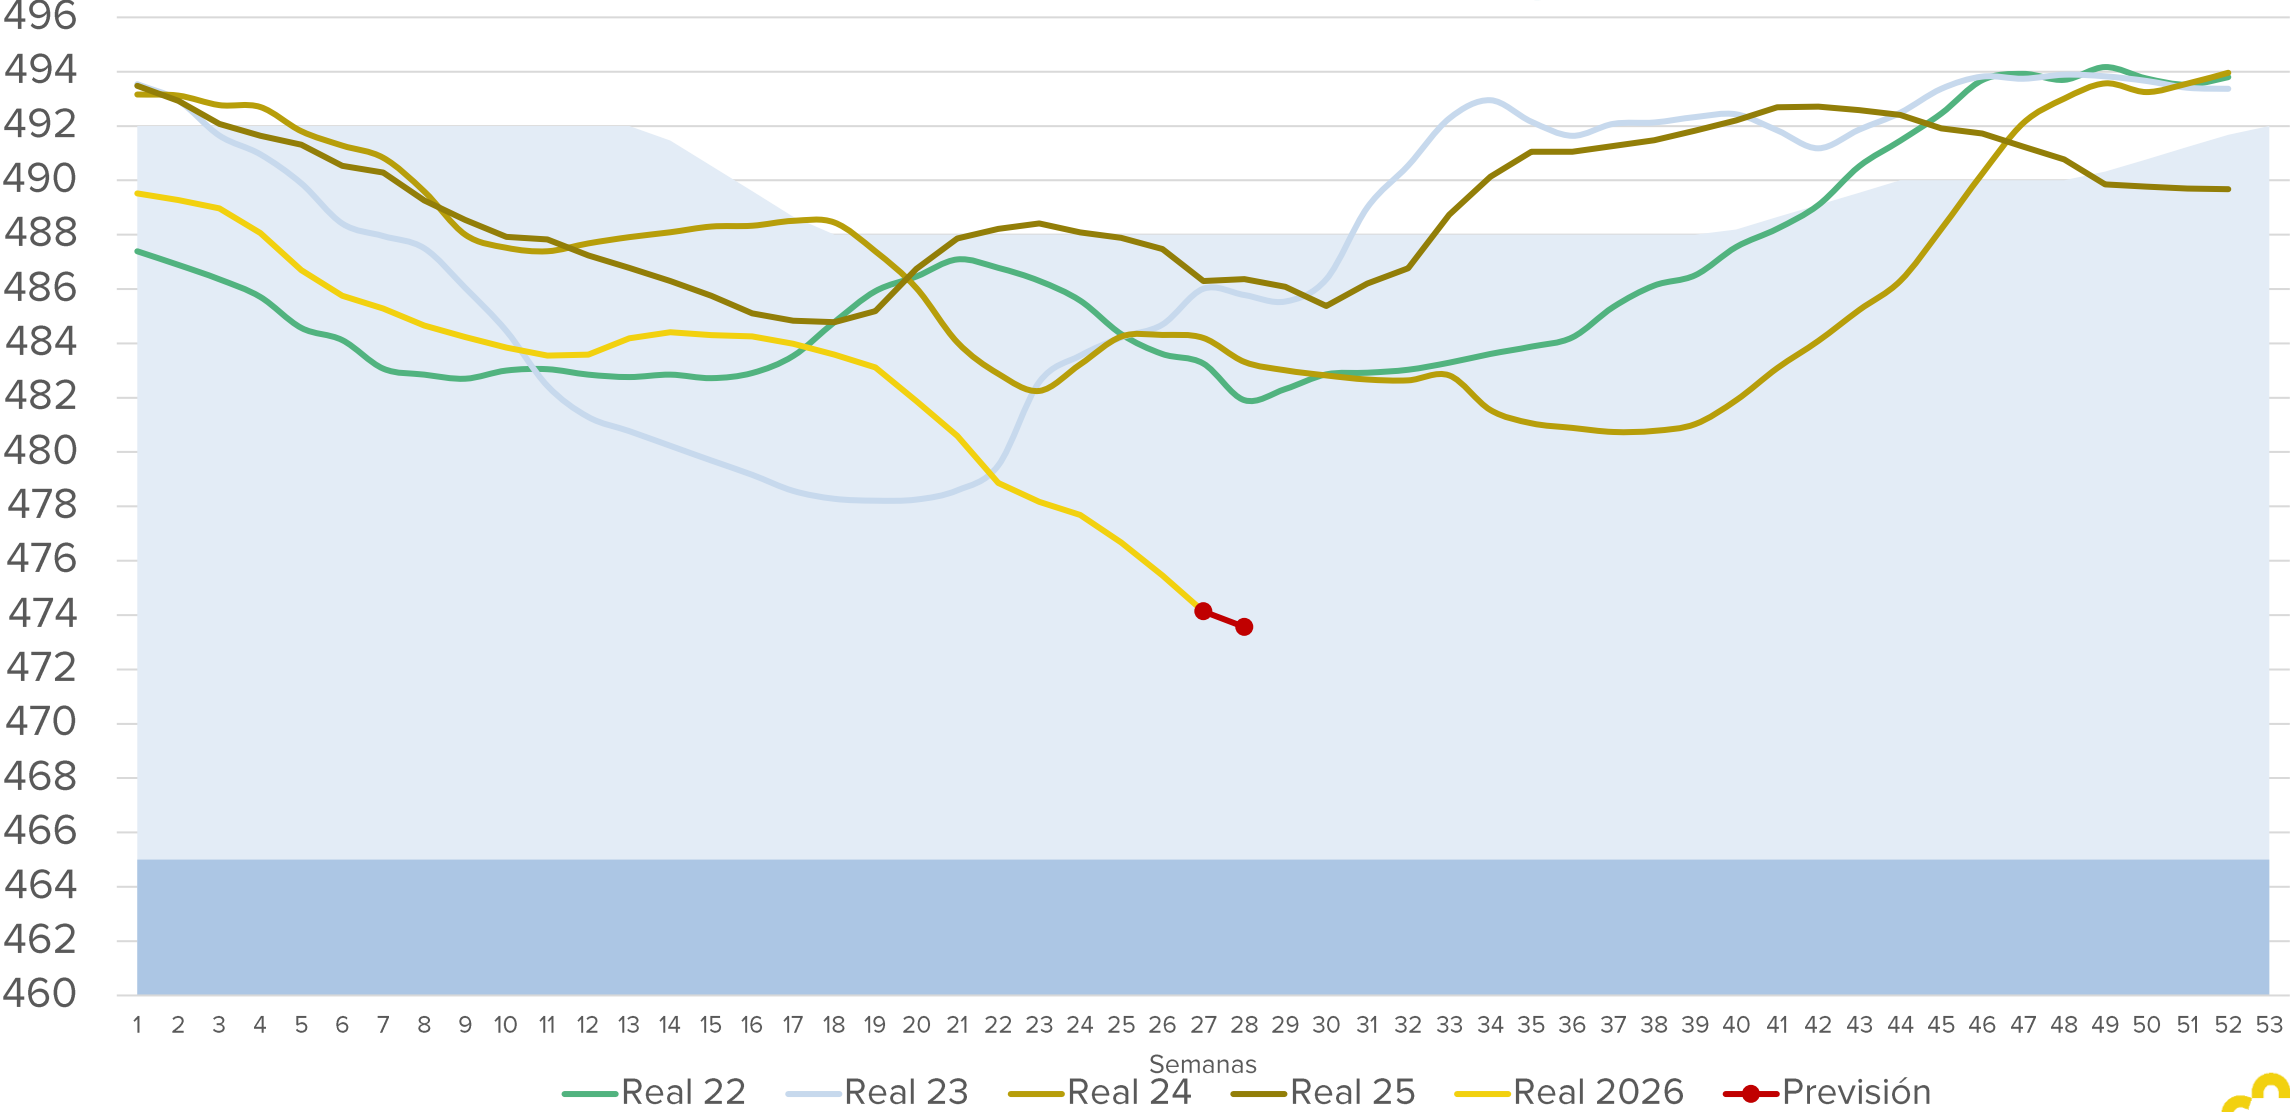

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 27

Condiciones previstas de Operación en el STAT (Sistema de Transporte en Alta Tensión):




Equipos del STAT indisponibles:

- F/S indisponible la Interconexión de 220 kV Clorinda (ARG) – Guarambaré (PAR), por torre caída, sin previsión de disponibilidad.
- Continúan F/S desde 16/04 la Línea de 500 kV Garabí - Rincón (YACYLEC) y la Conversora Garabí II (ONS), para trabajos tareas de mantenimiento quedando indisponible la Conversora hasta el 03/08. Limitando la capacidad de intercambio con Brasil a 1100 MW.
- Continúa F/S el Compensador Sincrónico N°4 de ET Ezeiza (TRANSENER) para mantenimiento de CAR. Se prevé disponible el 08/07.

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 27

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES

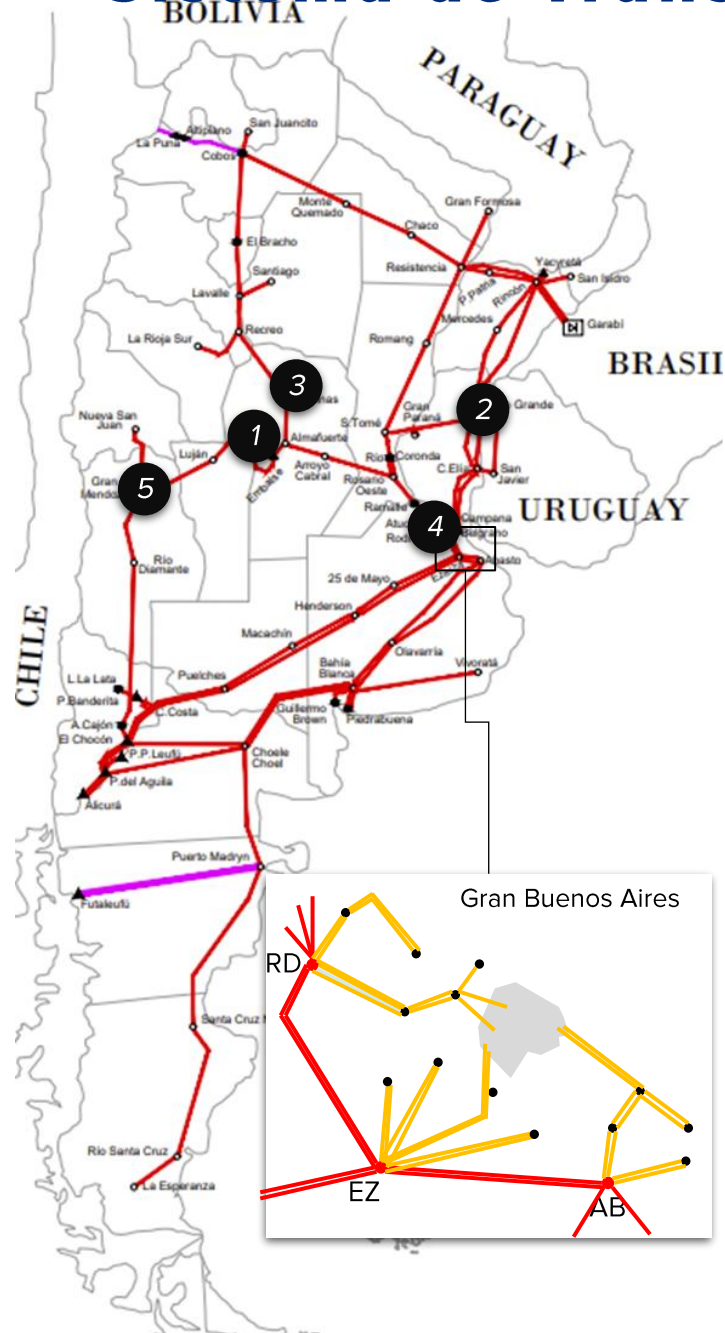[illegible]

Sistema de Transporte, Distribución y Control

Nuevas habilitaciones de Transporte por Distribución Troncal:

El 15/06/2026 quedó **E/S por primera vez la Línea de 132 kV Tablada – Oeste Nueva** y deja de estar operativa la Línea de 132 kV Tablada – Oeste. Esto asociado a la **ET Oeste Nueva (GIS)**, jurisdicción de EPEC en la provincia de Córdoba.



El 16/06/2026 quedaron **E/S por primera vez las Líneas de 132 kV San Martín – Mendoza y Mendoza – Rosario Centro** asociadas a la nueva **ET Mendoza**, jurisdicción de EPESF, seccionando la Línea de 132 kV San Martín – Rosario Centro en la provincia de Santa Fe.



El 17/06/2026 tomó carga por primera vez la **Línea de 500 kV Salto Grande Uruguay – Chamberlain**, jurisdicción de UTE.



Nuevo Equipamiento de Generación



El 13/06/2026 se habilitó comercialmente en el MEM del **Parque Solar Fotovoltaico “SAN LUIS OESTE”** (TECSOL S.A.) por una **potencia de 8.87 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET CT23, jurisdicción de EDESAL, en la provincia de San Luis.



El 01/07/2026 se habilitó la operación comercial en el MEM del **Parque Solar “Bella Vista Secco”** (INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A.) por una **potencia de 7 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET Bella Vista, jurisdicción de DPEC, en la provincia de Corrientes.



El 03/07/2026 se habilitó la operación comercial en el MEM del **Parque Solar Fotovoltaico “360E Palomar”** (PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.) por un incremento de **potencia de 5 MW, totalizando 11 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET Sevel jurisdicción de EDENOR, en Gran Buenos Aires.



Nuevo Equipamiento de Generación



El 03/07/2026 se habilitó una nueva Unidad de mediciones Fasoriales PMU “**San Luis Oeste**” ubicado en el FV homónimo. Se vincula a la ET San Luis Centro en el nivel de 33 kV, jurisdicción de EDESAL, en la provincia de San Luis.

