



CAMMESA

Previsión Semanas 25/26 y 26/26

Despacho Energético

Gerencia de Coordinación Operativa, 19/06/26



Pronóstico oficial del día viernes, 19 de Junio de 2026 - actualizado a las 06:49 horas

 Viernes, 19 de Junio de 2026	Mañana	Tarde	Noche
Tiempo	 Parcialmente nublado	 Ligeramente nublado	 Parcialmente nublado
Prob. Precipitación	0 - 10%	0%	0%
Temperatura (°C)	9	15	11
Viento (km/h)	23 - 31	13 - 22	0 - 2
Dirección Predominante	SO	S	SO
Ráfagas (km/h)	42 - 50	-	-

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires

(fuente Weather Channel)

Pronóstico diario

Buenos Aires, Argentina · as of 12:12 p. m. ART

Día	Condiciones	Bajo	Alto	Viento
Por la noche	 6% Mayormente despejado	6°	16°	11 km/h → WNW
sáb 20	 7% Parcialmente nublado	9°	15°	12 km/h ↓ N
dom 21	 5% Nublado	7°	13°	8 km/h ↓ NNW
lun 22	 10% Parcialmente nublado	5°	12°	20 km/h → WSW
mar 23	 5% Parcialmente nublado	5°	12°	19 km/h → WSW
mié 24	 6% Mayormente soleado	7°	12°	14 km/h → WNW
jue 25	 14% Mayormente soleado	7°	14°	19 km/h ↘ NW
vie 26	 7% Parcialmente nublado	8°	14°	12 km/h ↓ NNE
sáb 27	 9% Parcialmente nublado	8°	14°	13 km/h ↘ NNE
dom 28	 40% Chubascos	8°	13°	11 km/h ← E

Escenario previsto

Importación:

Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil: Con oferta comercial.

Exportación:

Uruguay y Brasil: No se realiza oferta de exportación comercial.

Gas y Combustible alternativo: El gas promedio de esta semana cierra en 39 Mm³, previendo disponibilidad de 35 Mm³ para la semana próxima que no serán suficientes para cubrir el requerimiento de la demanda por lo que se recurrirá a 25.000 tn de carbón, 18.000 tn de FO y 98.000 m³ de GO.

Salto Grande: 14 unidades disponibles. Opera con despacho medio con promedio semanal de aportes 2.800 m³/s.

Yacyretá: Opera despacho medio, con entrante promedio en el orden de 9.600 m³/s. ANDE prevé tomar 200 MW en horario de pico.

Comahue: Caudales entrantes actuales de 107 m³/s en el Limay, 129 m³/s en el Collón Curá y 78 m³/s en el Neuquén.

Chañar: Erogado 46 m³/s definido por AIC.

Arroyito: Erogado en 500 m³/s.



Situación parque generador

CENTRALES TÉRMICAS				
CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
ATUCHA I		Indisponible	31-mar-27	Extension de vida útil
ROJO	TG02	Indisponible		
P. NUEVO	TV09	Indisponible	Fines de julio	Mantenimiento Estacional
LUJAN DE CUYO	TG26	Indisponible	Sin previsión	Falla en generador
BROWN	TG01	Indisponible		Comienzo de ensayos duran la semana próxima
S. FRANCISCO	TG01	Indisponible		Retraso en la finalización del Mantenimiento Estacional
S. OESTE	TG01 y TG04	Indisponible		Rotura de rotor de turbina
V. MARÍA	TG02 y TG03	Indisponible		Altas vibraciones

CENTRALES HIDRÁULICAS				
CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
YACYRETÁ	U01	Indisponible	27-nov	Mantenimiento Estacional
	U04	Indisponible	22-jun al 14-jul	Mantenimiento Estacional
	U10	Indisponible	26-feb-27	Mantenimiento Estacional
RÍO GRANDE	U01 y 04	Indisponible	Sin previsión	Por falla estatórica
	U03	Indisponible	Sin previsión	
L. VIÑAS	U01 y U02	Indisponible		Pérdida de agua en cañería principal
NIHUILES	NIH2 y NIH3	Indisponible	Sin previsión	Temporal 11-01
LOS REYUNOS	U01	Indisponible	Comienzo de julio	Mantenimiento Estacional hasta el 19-jun
EL TIGRE	U01 y U02	Indisponible	3-ago	Mantenimiento Estacional




Perspectivas para la próxima semana


Balance Semanal			Semana 25		Semana 26	
			15/6/2026 - 21/6/2026		22/6/2026 - 28/6/2026	
			Gwh	MWmed	Gwh	MWmed
Consumo Combust.	Demanda		3184	18951	3496	20807
	Exportación		0	0	0	0
	Térmico		1640	9762	1882	11202
	Hidráulico		605	3598	698	4155
	Nuclear		236	1404	235	1399
	Renovable		520	3095	477	2841
	Importación		187	1115	203	1210
	Gas	Mm3/día		39		35
	FO	Miles de Ton		9		18
	GO	Miles de m3		28		98
	Carbón	Miles de Ton		23		25
Despacho MW med	ALICURA		134		234	
	PIEDRA		467		760	
	CHOCON		207		282	
	P.BANDERITA		21		21	
	FUTALEUFÚ		352		528	
	SALTO		329		413	
	YACYRETA		1672		1470	
Niveles (msnm)			Hoy	Domingo	Domingo	
	ALICURA		698.98	698.81	697.41	
	PIEDRA		577.39	577.05	575.86	
	CHOCON		373.06	373.13	373.32	
	P.BANDERITA		411.72	411.74	411.77	
	FUTALEUFÚ		477.20	476.39	473.73	
	SALTO		33.58	34.33	33.70	




Evolución Cota Alicura 💧

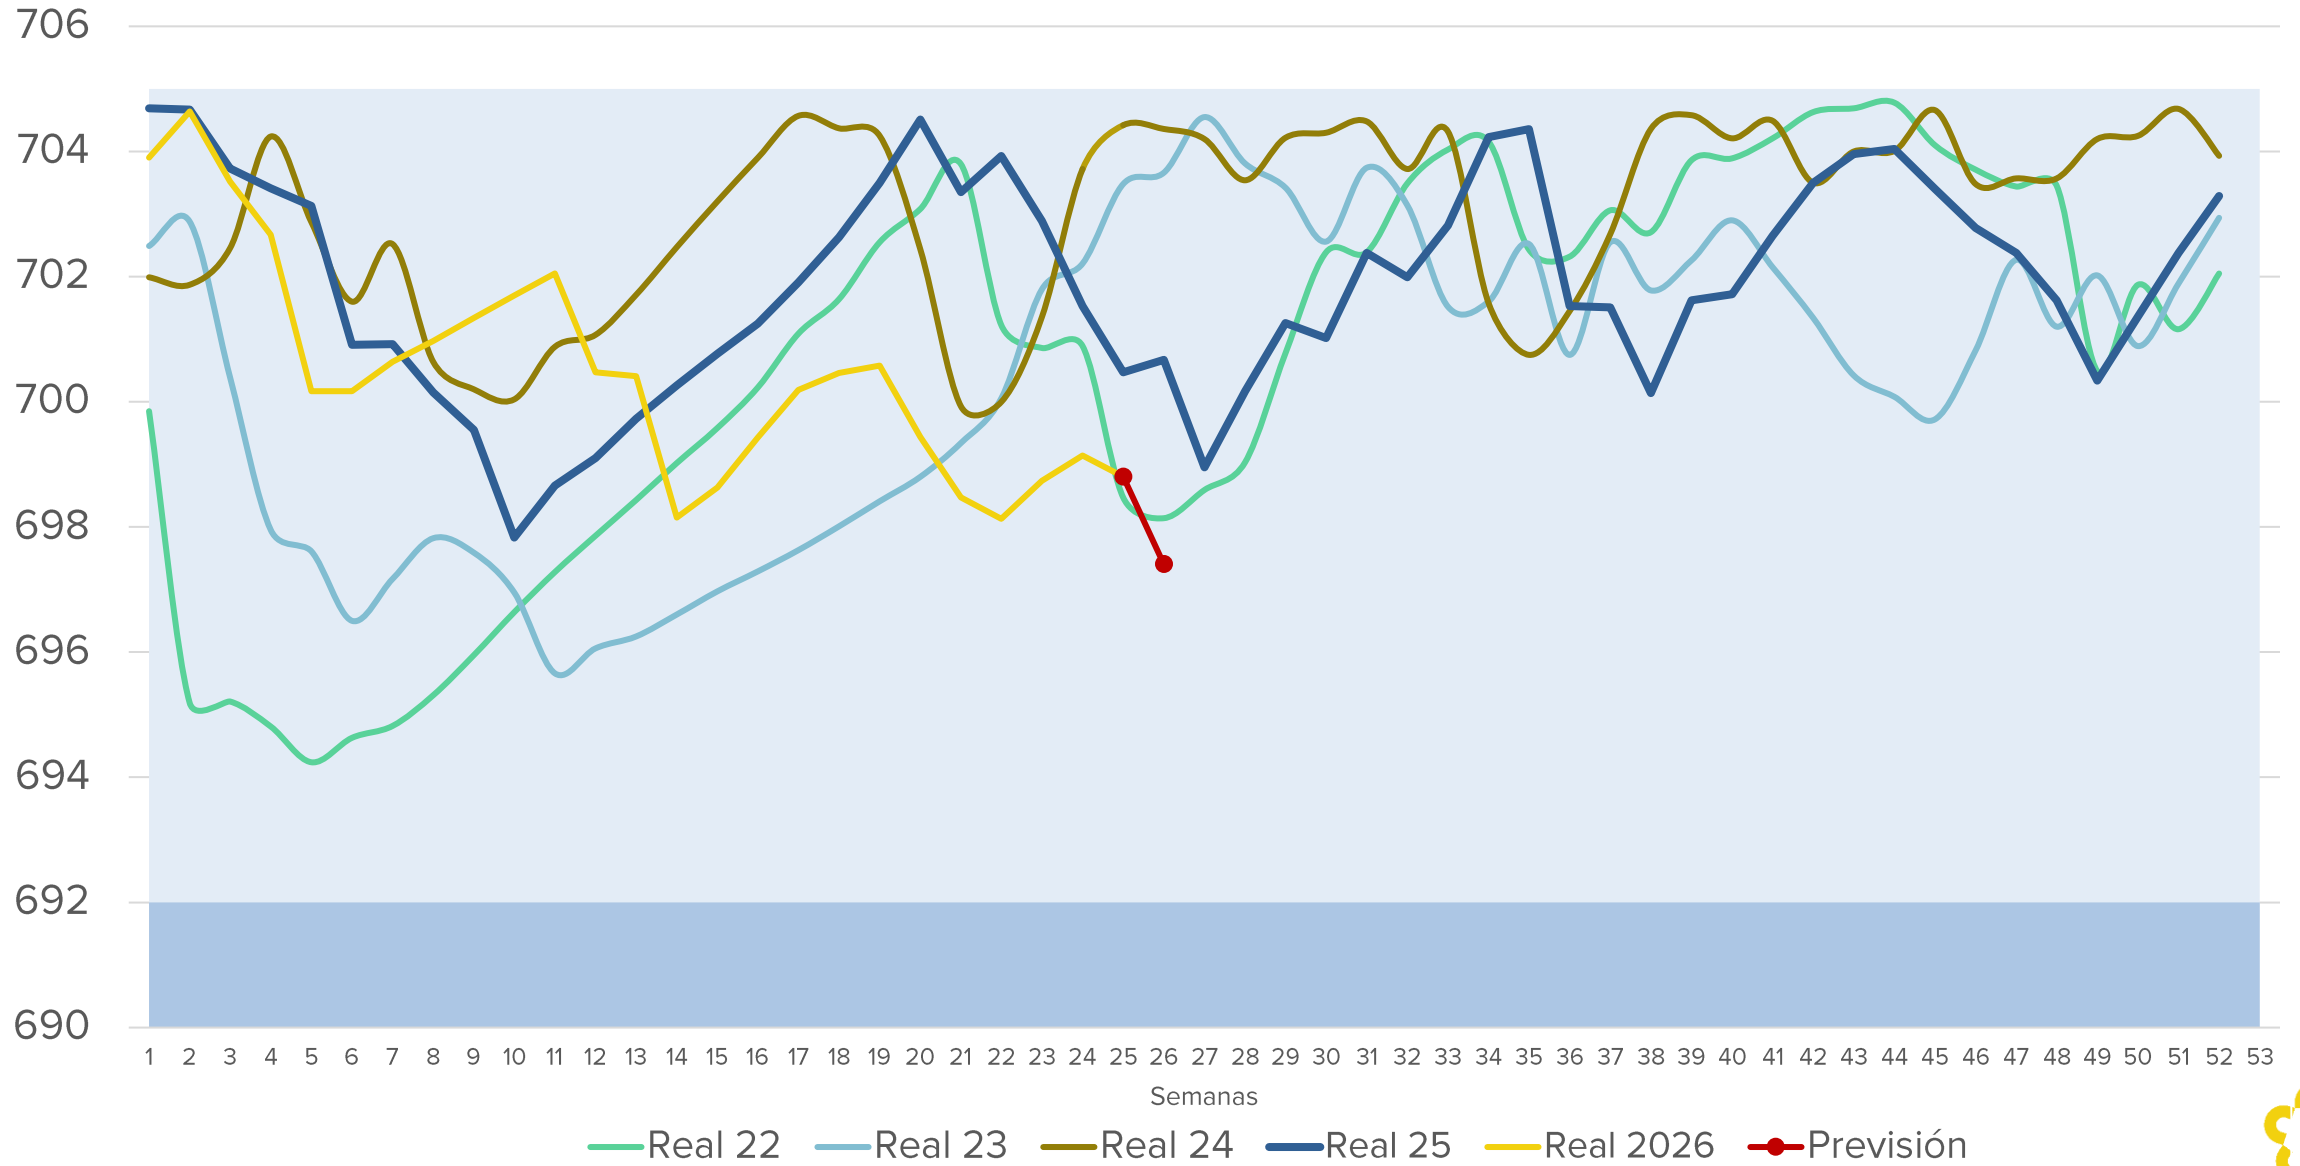


Evolución Cota Piedra del Águila 💧

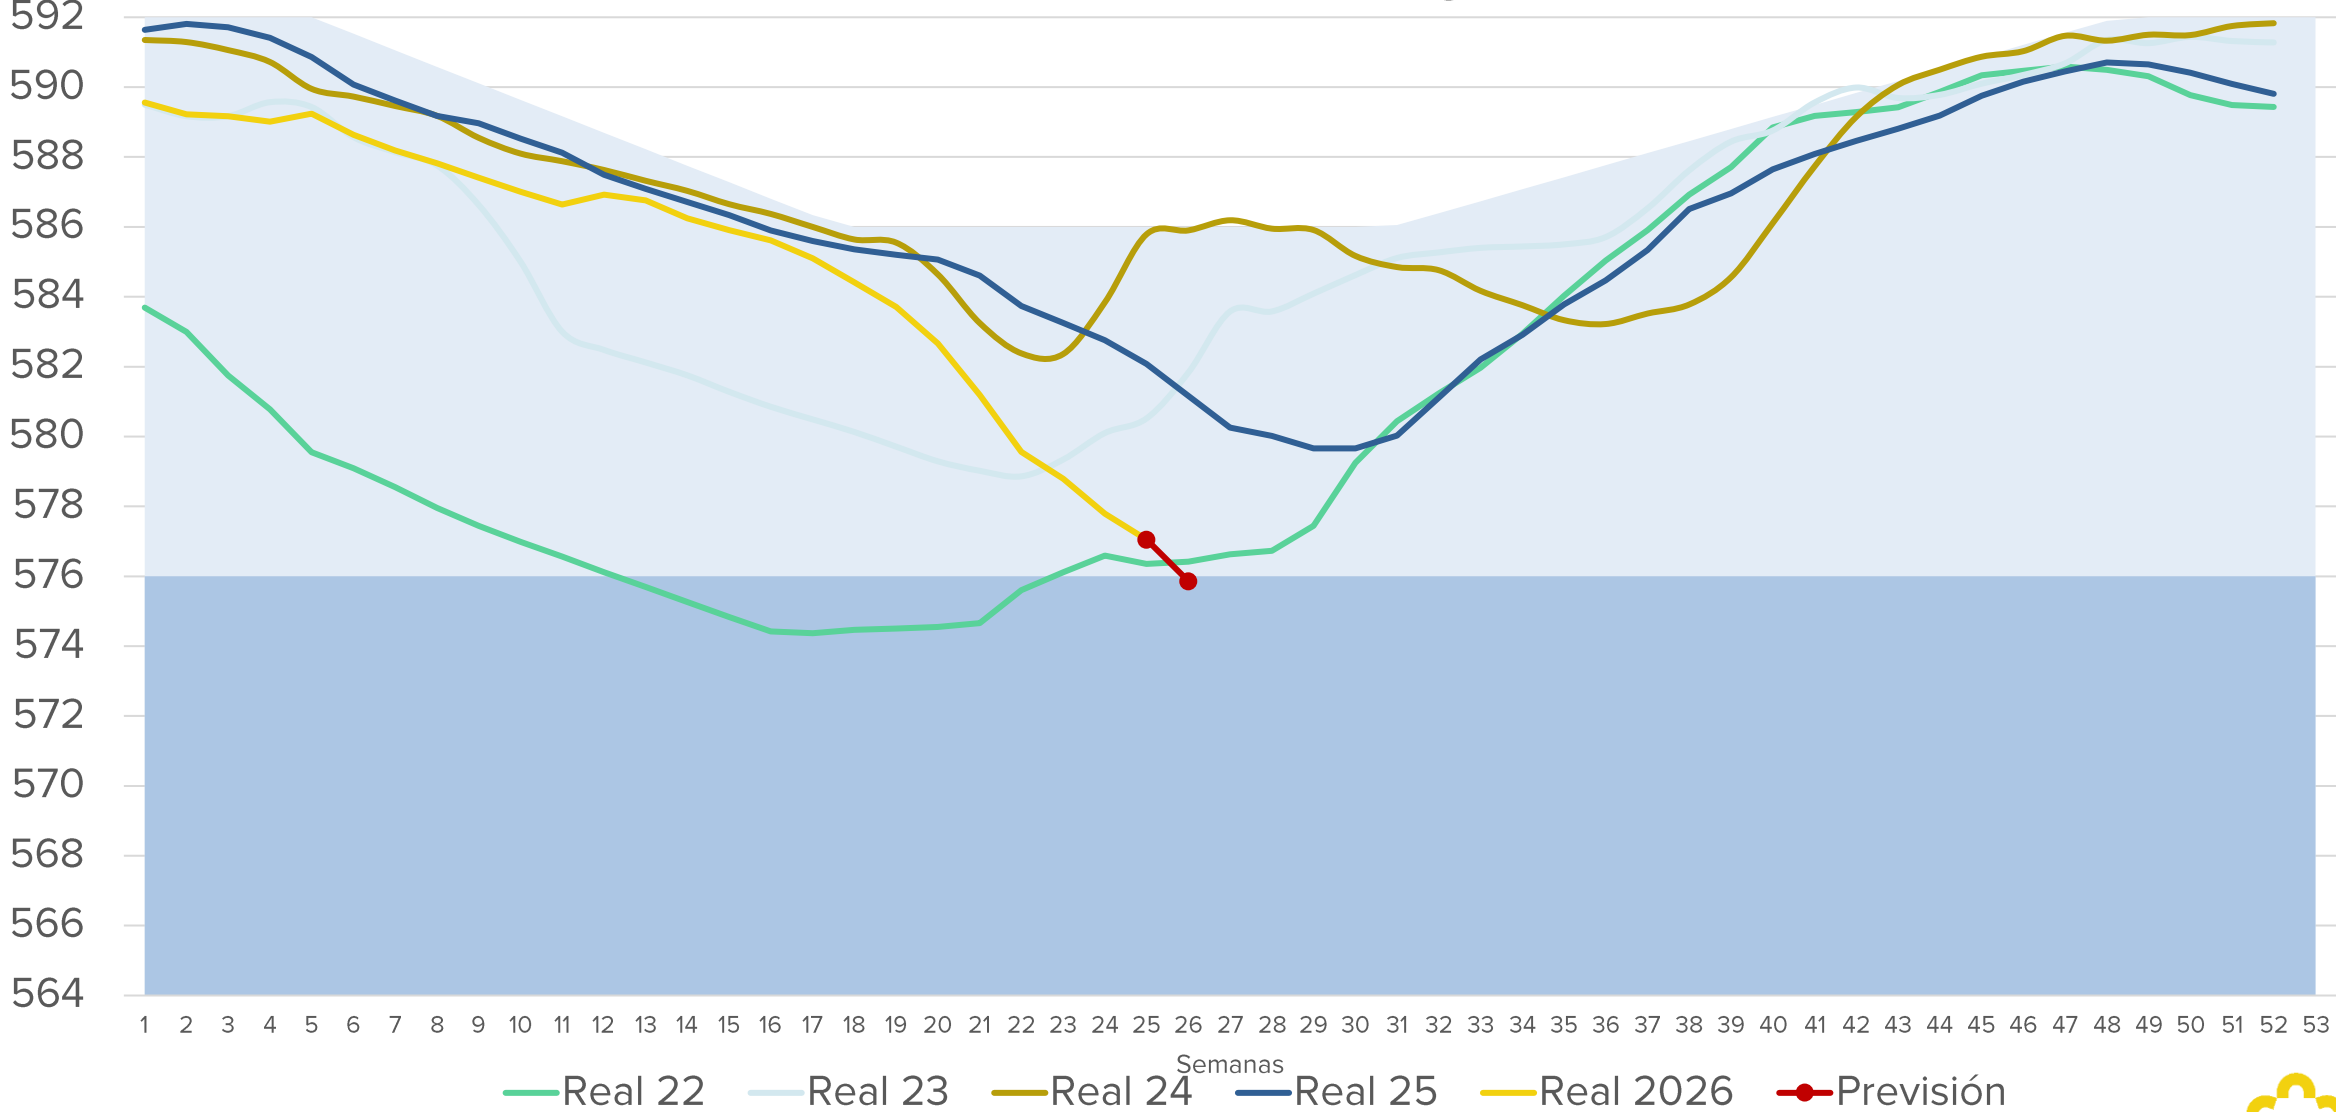


Evolución Cota Chocón 💧

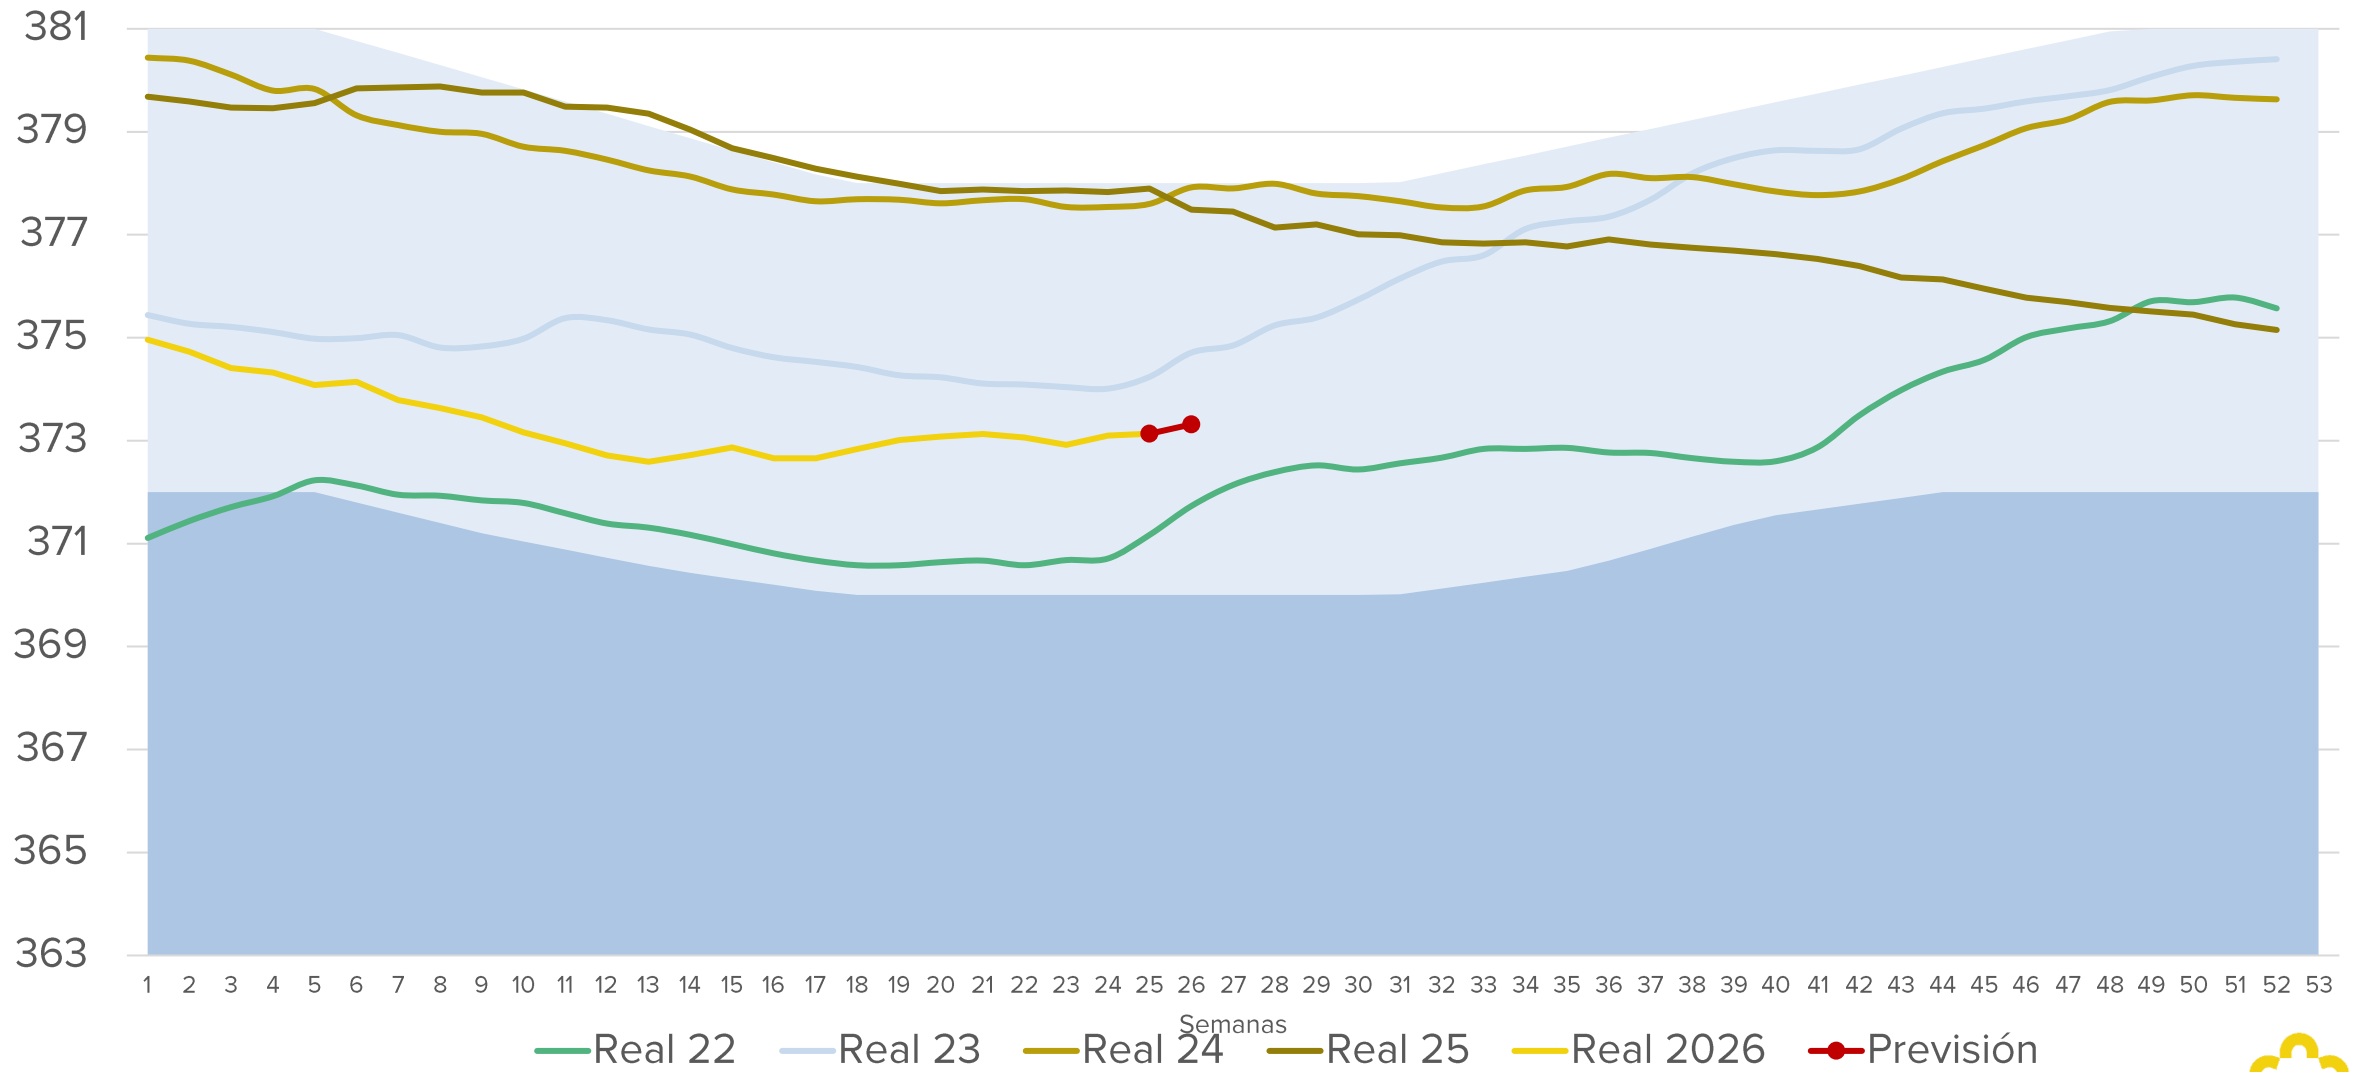

Evolución Cota Planicie Banderita 💧

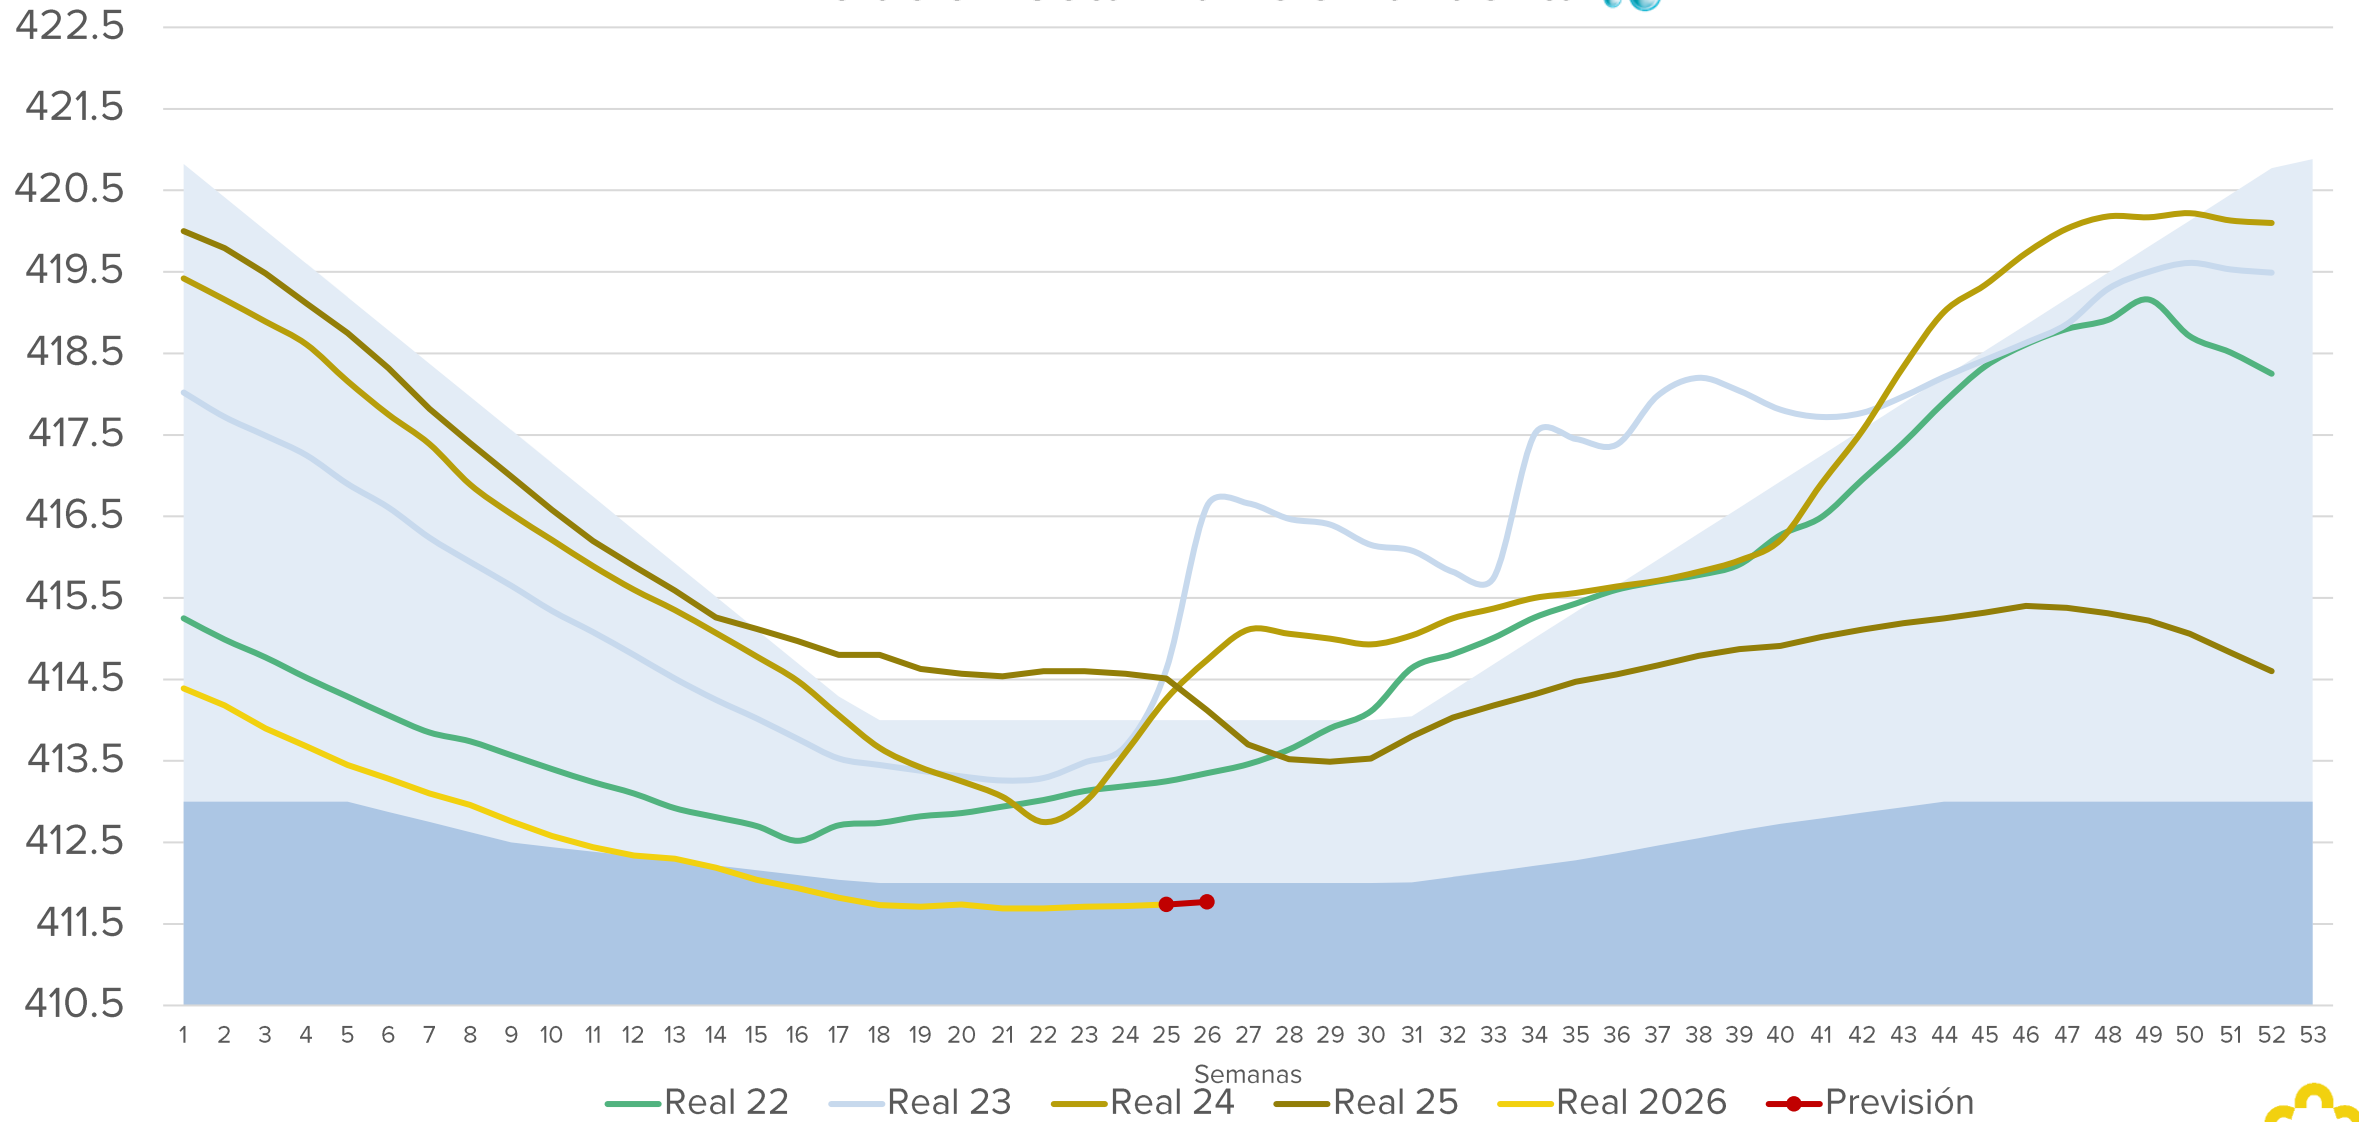

Evolución Cota Futaleufú

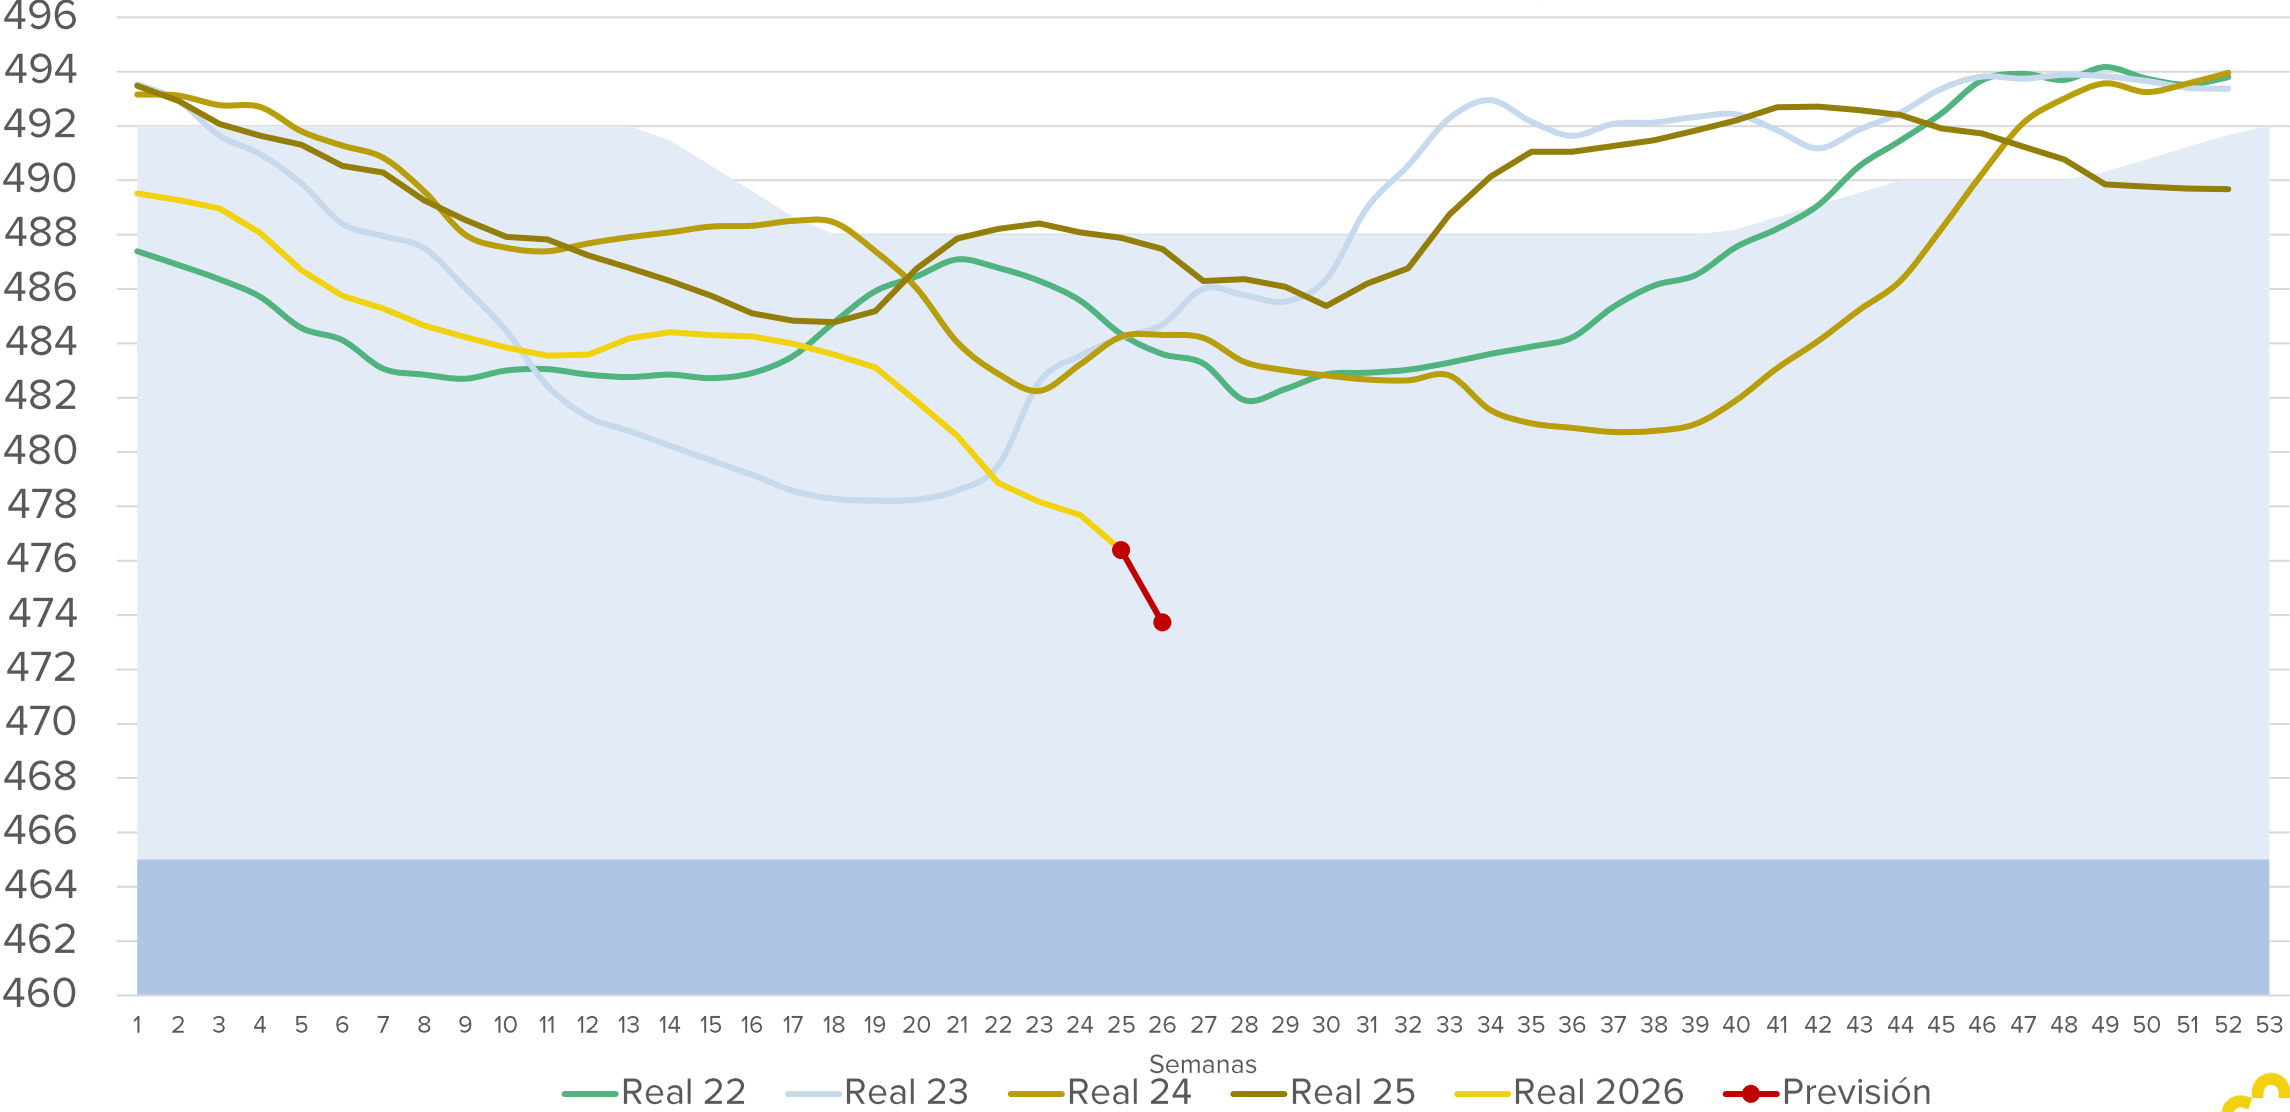

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 26

Condiciones previstas de Operación en el STAT (Sistema de Transporte en Alta Tensión):




Equipos del STAT indisponibles:

- F/S indisponible la Interconexión de 220 kV Clorinda (ARG) – Guarambaré (PAR), por torre caída, sin previsión de disponibilidad.
- Continúan F/S desde 16/04 la Línea de 500 kV Garabí - Rincón (YACYLEC) y la Conversora Garabí II (ONS), para trabajos tareas de mantenimiento quedando indisponible la Conversora hasta el 03/08. Limitando la capacidad de intercambio con Brasil a 1100 MW.
- Continúa F/S el Compensador Sincrónico N°6 de ET Ezeiza (TRANSENER) para mantenimiento de CAR previsto hasta el 22/06.
- Se prevé F/S del 20/06 hasta el 28/06 el Compensador Sincrónico N°5 de Ezeiza (TRANSENER) para mantenimiento de CAR.

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 26

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES


Nº	EQUIPO	PROPIETARIO	TRABAJO	20/6	21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6
2	Transformador N°2 (500/16 kV – 440 MVA) de ET Río Grande	TRANSENER	Desconexión del transformador principal	X	X	X	X	X	X	X
3	Transformador N°1 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Vivotatá	TRANSENER	Ensayos eléctricos de bushings y maquina	X	X					
4	Transformador N°2 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Malvinas	TRANSENER	Montaje Sincronizador CSD	X						
5	Transformador N°12 (220/132 kV – 300 MVA) de ET Ezeiza	EDESUR	Equipo asociado		X					
6	Línea de 500 kV Bahía Blanca - Olavarría 2	TRANSENER	Mantenimiento general de equipos asociados				X	X	X	
7	Línea de 220 kV Ramallo - Rosario Oeste 2	TRANSENER	Retiro de nidos y limpieza de batea en Torre 25				X			
8	Barra B de 500 kV de ET Malvinas	TRANSENER	Montaje de conductores aéreos entre pórtico III y IV de campo 2				X	X		
9	Barra A de 500 kV de ET Puelches	TRANSENER	Mantenimiento General				X	X	X	
10	Capacitor Serie 1 de ET Recreo	TRANSENER	Mantenimiento General de Protecciones				X	X		
11	Línea de 220 kV Atucha - Villa Lia 1	TRANSENER	Modificación circuito antibombeo de Int + Pruebas de recierre					X	X	X
12	Transformador N°2 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Rincón	TRANSENER	Mantenimiento estacional de seccionadores acometida, Protecciones y Mediciones Especiales					X	X	X
13	Línea de 500 kV Chocón Oeste - Piedra Aguila 2	TRANSENER	Mantenimiento General Acometida						X	

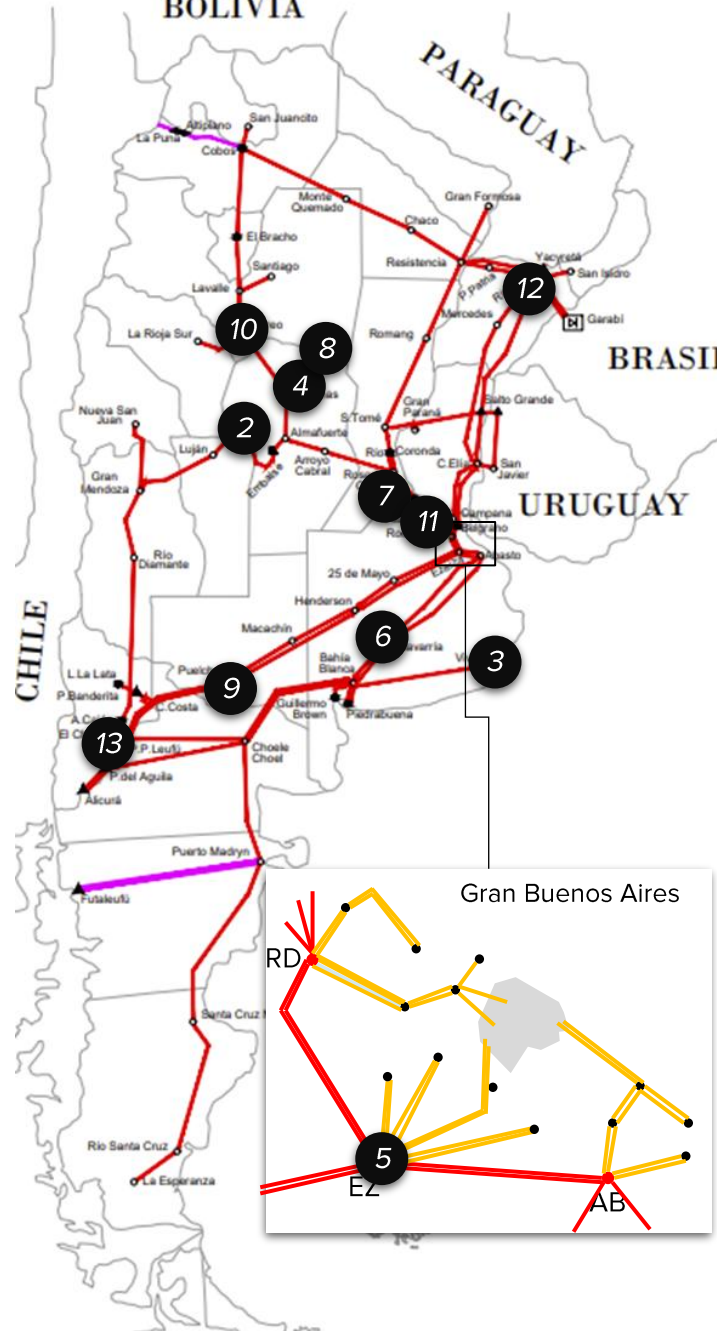


Sistema de Transporte, Distribución y Control

Nuevas habilitaciones de Transporte por Distribución Troncal:


El 02/06/2026 se habilitó comercialmente el nuevo Transformador N°3 (220/33 kV – 125 MVA) de ET El Quemado, operado por DISTROCUYO en la provincia de Mendoza.



El 26/05/2026 se habilitó comercialmente el nuevo Transformador N°1 (132/33/13.2 kV – 40 MVA) de ET San Nicolás Norte, operado por TRANSBA en la provincia de Buenos Aires.




Nuevo Equipamiento de Generación



El 06/06/2026 se habilitó la operación comercial en el MEM del **Parque Solar Fotovoltaico “San Juan Sur”** (GENNEIA S.A.) por un **incremento de potencia de 69.2 MW**, totalizando **129.2 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET San Juan Sur, jurisdicción de Naturgy/Energía San Juan, en la provincia de San Juan.



El 06/06/2026 se habilitó la operación comercial en el MEM del **Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”** (LUZ DE CAMPO S.A.) por un **incremento de potencia de 105 MW**, totalizando **305 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET El Quemado, jurisdicción de DISTROCUYO, en la provincia de San Juan.



El 13/06/2026 se habilitó comercialmente en el MEM del **Parque Solar Fotovoltaico “SAN LUIS OESTE”** (TECSOL S.A.) por una **potencia de 8.87 MW**. Se conecta en el nivel de 33 kV la ET CT23, jurisdicción de EDESAL, en la provincia de San Luis.

